Relatório 002/2026 - MARÇO/2026

Projeto:

No mês de março foi dada continuidade ao projeto de **Substituição das tecnologias que sustentam o Serviço 1746**, pela solução de CRM da Salesforce.

Atividades executadas - Março de 2026

a. Resumo das principais Reuniões

- 1746 - OmniChanell - Mapeamento Preliminar de Stakeholders - (02/03)
- Workshop: WhatsApp (Mkt Cloud) - (03/03)
- Workshop: WhatsApp (Agentforce) - (03/03)
- Workshop - Portal + Salesforce - (04/03)
- Configuração SSO Marketing Cloud - (04/03)
- Checkpoint com SUBTD - (05/03)
- Criação WABA - Iplanrio (06/03)
- Alinhamento das Campanhas de disparos - WhatsApp - (09/03)
- Apresentação Salesforce Signature - IplanRio (09/03)
- Alinhamento inicial da arquitetura DataCloud <> Marketing Cloud <> Service Cloud - (10/03)
- Checkpoint com SUBTD - (11/03)
- Configuração do WhatsApp - (11/03)
- Reunião de elaboração da Matriz RACI - (11/03)
- Dúvidas sobre o Agentforce - (12/03)
- Explicação/Validação da estrutura inicial do Service Cloud - (12/03)
- GMO Salesforce - Matriz RACI, Riscos & Stakeholders - (12/03)
- IplanRio - Apres. Data Cloud - (13/03)
- Estrutura Service Cloud + Marketing Cloud - (16/03)
- Alinhamento Service Cloud + Marketing Cloud - (17/03)
- Checkpoint com SUBTD - (19/03)
- Alinhamentos de Gestão - Iplan e TO - (19/03)
- Alinhamento sobre gestão de Riscos - (20/03)
- Componentes Custom do projeto - (20/03)
- Config do WABA - (23/03)
- IPLANRIO - Signature - Acompanhamento Semanal - (23/03)
- Confecção do status report semanal - (23/03)
- Sales Force - Status Report - (24/03)
- WPP Receptivo, hands-on & Q&A - (24/03)

- Desenho inicial da estrutura da estrutura de comunicação - (24/03)
- Definição do Fluxo de comunicação do MKT - (24/03)
- Fluxos e temas de ouvidoria - (24/03)
- Desenho do fluxo de cadastro - (25/03)
- Checkpoint com SUBTD - (26/03)
- Fluxo de cadastro do cidadão no Salesforce - (26/03)
- Iplanrio & SF/TO - Agentforce Discovery - (27/03)
- Levantamento SECONSERVA - (27/03)
- Novo Desenho Integração 1746 - (27/03)
- Ajustes - Cronograma/Status Report - (27/03)
- Plano de transição - Tecnologia 1746 - (27/03)=
- Confecção do status report semanal - (30/03)
- IPLANRIO - Signature - Acompanhamento Semanal - (30/03)
- Sales Force - Status Report - (31/03)
- Follow Up CzRM - IPLAN <> SUBTD <> TO - (31/03)
- Checkpoint com SUBTD - (31/03)
- Canal Voz 1746 Reunião com a Nice e TO - (31/03)

b. Resumo das principais atividades gerenciais

- Acompanhamento de projeto
- Atualização de Cronograma
- Realização de status Report
- Realização de reuniões de controle
- Gestão de riscos e impedimentos
- Revisão de decisões técnicas (ADRs)
- Refinamento de requisitos técnicos e de negócio (Aba “Levantamento de Requisito”)
- Mapeamento de stakeholders (Aba “Stakeholders CRC”)
- Suporte às lideranças de negócio
- Alinhamentos de GMO
- Análises de solução
- Elaboração e melhorias da arquitetura da solução (Aba “ERD – Objects”)
- Elaboração de planos de Integração

c. Resumo das principais atividades técnicas

➢ Relatório detalhado de horas, retirado da ferramenta de registro e acompanhamento de projetos - Jira no Anexo I.

1 – Instanciamento básico - Marketing Cloud

- Configuração da WABA e SAP na plataforma de Marketing Cloud para o viabilização de comunicações através do WhatsApp e e-mail.

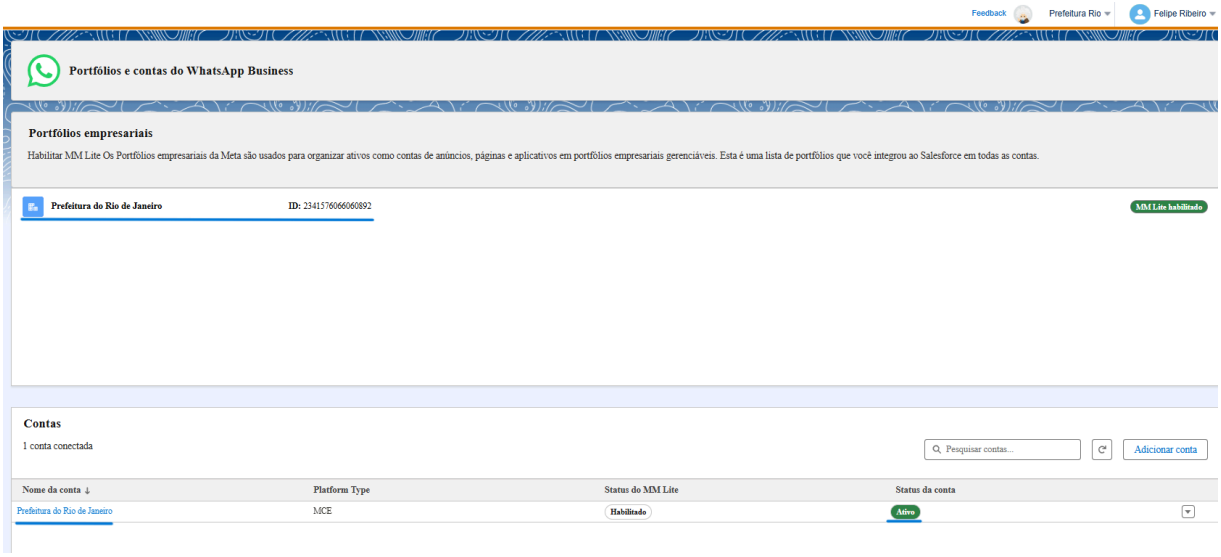

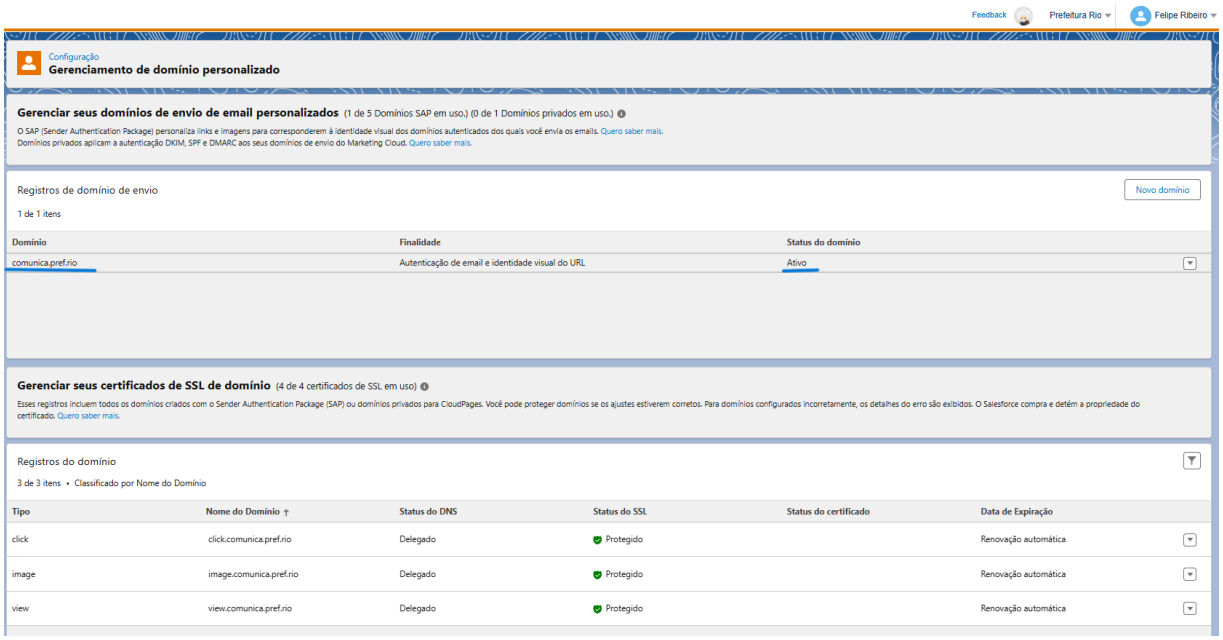

2 – Criação de campanhas de disparo ativo via WhatsApp

- Elaboração da estrutura de comunicação entre Data Lake, Data Cloud e Marketing Cloud, que será usado para trazer as informações do cidadão que irão alimentar as campanhas de disparo ativo.

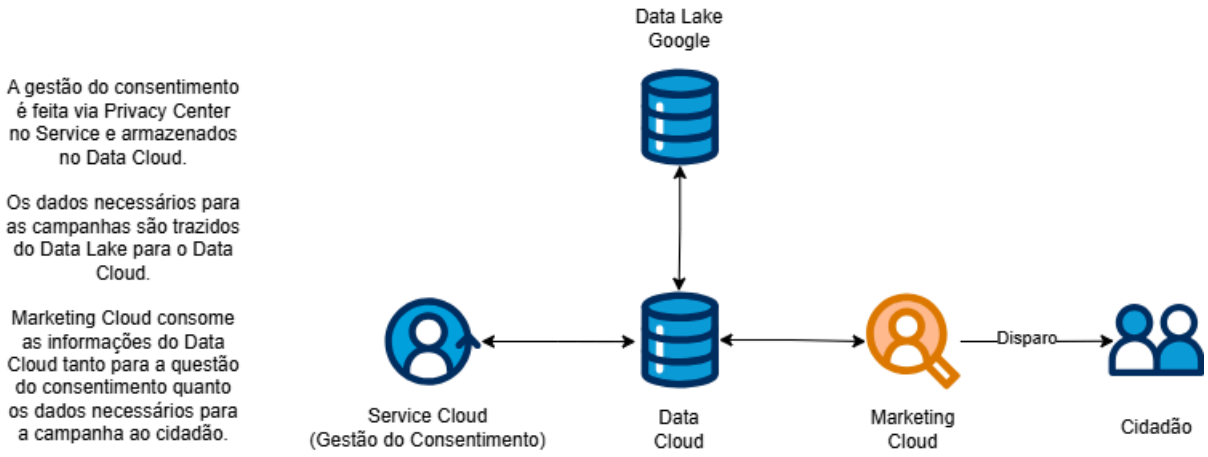

3 – Ciclo de vida dos serviços (Abertura, roteamento, tratativa e fechamento)

- Criação do Componente de mapas do Arcgis que irá servir para coleta de endereço do cidadão no momento de abertura do chamado.

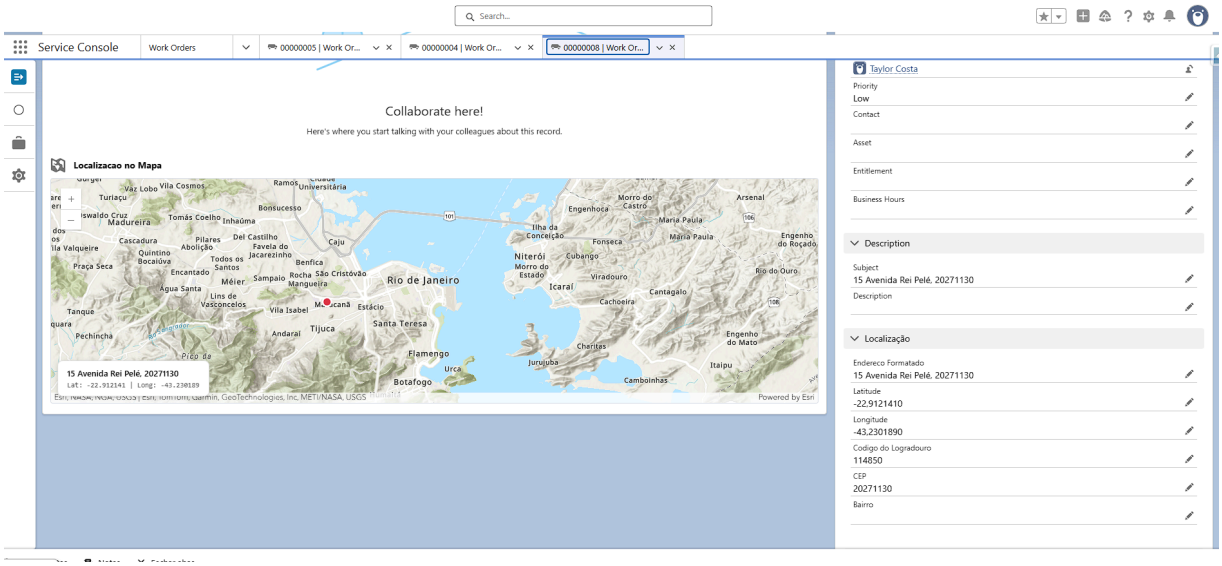

- Criação e configuração dos Objetos Customizados no Salesforce, estruturando as entidades de negócio, as regras de roteamento e a lógica dos Serviços que sustentam os fluxos operacionais.

CONFIGURAÇÃO

Gerenciador de objetos

107+ itens, classificados por Última modificação

RÓTULO	NOME DA API
Configuração de eventos de andamento	WorkOrder_Event_Config__c
Membro da UO	Org_Unit_Staff__c
Dependência entre serviços	Service_Dependency__c
UO do Serviço	Org_Unit_Service__c
Atributo de Serviço	Service_Attribute_Library__c
Valor do Atributo	Service_Attribute_Value__c
Configuração de Formulário de Serviço	Service_Form_Config__c
Unidade Organizacional	Organizational_Unity__c
Log Event	Log_Event__c
Lookup Rollup Summary	dlrs__LookupRollupSummary__c
Lookup Rollup Summary Schedule Item	dlrs__LookupRollupSummaryScheduleItems__c
Lookup Rollup Summary Log	dlrs__LookupRollupSummaryLog__c
Lookup Rollup Calculate Job	dlrs__LookupRollupCalculateJob__c
Lookup Parent	dlrs__LookupParent__c
Lookup Child	dlrs__LookupChild__c
Bairro	Neighborhood__c
Logradouro	Public_Way__c
Pesquisa de Satisfação	CSAT__c
Divisão Administrativa	Administrative_Division__c
Resposta da pesquisa	CSAT_Answers__c
Catálogo de Serviço	Service_Catalog__c
FlowTableViewDefinition	FlowTableViewDefinition__c
Flow Personal Configuration	FlowPersonalConfiguration__c

4 – Integração do Salesforce com sistemas externos

- Integração com o IPP
  - Criação da api *ipp-pgeo-sys-api* responsável por integrar dados geográficos de trechos de logradouros do sistema IPP (ArcGIS) para o Salesforce. (Documentação: IPP PGeo System API (ipp-pgeo-sys-api) - VPIA - Confluence)



- Elaboração da Proposta Integração SGRC > Mulesoft > Departamentos, com a finalidade de estruturar o “as is” das integrações atuais com sistemas externos e planejar o “to be” do que deve ser uma estrutura futura.

  - Documentação: [Proposta Integração SGRC > Mulesoft > Departamentos - VPIA - Confluence]

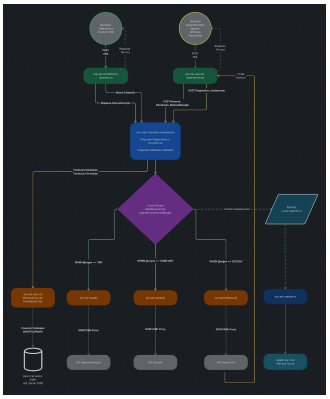
R$

Horas técnicas - Março de 2026

					Horas	Valor unitário	
Serviços Especializados	**29**	Serviço técnico especializado	Core	Hora	116	R$ 295,25	R$ 34.249,00
			GMO	Hora	40	R$ 295,25	R$ 11.810,00

			Mkt Cloud	Hora	64	R$ 295,25	R$ 18.896,00
			Arquiteto	Hora	120	R$ 295,25	R$ 35.430,00
			Gestão	Hora	364	R$ 295,25	R$ 107.471,00
			Mulesoft	Hora	176	R$ 295,25	R$ 51.964,00
			Field Service	Hora	16	R$ 295,25	R$ 4.724,00
				Subtotal	**896**	**Subtotal**	**R$ 264.544,00**

Licenças - Março de 2026

	Item	Descrição	Produto	Unidade	Quantidade 2/12	Preço Unitário/ mensal	Preço Total
Atendimento	**1**	Atendentes Omnichannel em tempo real - síncronos	Service Cloud Enterprise Edition + Digital Engagement Enterprise Edition	Usuário	30	R$ 360,90	R$ 10.827,05

Gestão de Campanhas	**7**	Marketing Cloud Engagement - Enterprise Edition Plataforma de campanhas de marketing e comunicação	API Calls (por ano) - 200 milhões Automação 100.000 Contatos 500.000 Data Extension. Storage (GB) 100 Super Message (e-mails sem anexo) 150 milhões Usuários 100	Plataforma	1	R$ 80.765,41	R$ 80.765,41
	8	Contatos adicionais para campanhas de marketing	Additional Contacts	Pacotes de Contatos (1.000)	5.500 pacotes de 1.000 contatos por 12 meses	R$ 8,02	R$ 44.110,00
	9	Autenticação de Domínios em Nuvem (Organizações)	Private Domain	Domínio	1	R$ 4.812,16	R$ 4.812,16
	10	Certificado SSL	SSL Certificate	Certificado SSL	1	R$ 871,13	R$ 871,13
	11	Auditoria e Log da plataforma	Audit Trail	Aplicação	1	R$ 6.633,10	R$ 6.633,10

	12	Endereço IP Privado para envio de e-mails em larga escala em Nuvem IP	Private IP	Endereço IP	1	R$ 401,01	R$ 401,01
Atendimento Geral	**14**	Créditos utilizados em Data Cloud	Data Services Card 100K	Por Créditos a serem consumidos no Ano	45 pacotes de 100.000 créditos por 12 meses	R$ 268,88	R$ 12.099,64
Infraestrutura	**15**	Armazenamento de Dados	Customer Data Cloud - Data Storage (1024 GB)	Armazenamento disponibilizado	1	R$ 1.475,73	R$ 1.475,73
	16	Gerenciamento de privacidade de dados	Privacy Center	Aplicação	1	R$ 32.343,90	R$ 32.343,90
	17	Monitoramento de desempenho e disponibilidade	Event Monitoring	Aplicação	1	R$ 24.254,90	R$ 24.254,90
Logins	**18**	Logins mensais dos cidadãos no portal de autoatendimento	Customer Community - Unlimited Edition - Logins (Per Month)	Logins/mês	15.000	R$ 0,2742	R$ 4.112,50

Plataforma de Integração	**19**	Plataforma de integração avançada	MuleSoft - Anypoint Platform Base Subscription - Titanium Edition	Plataforma	1	R$ 65.163,84	R$ 65.163,84
	20	Capacidade de processamento da plataforma	MuleSoft - Additional vCore Production - Titanium Edition (No Flex)	VCore de expansão	1	R$ 27.544,79	R$ 27.544,79
Unidade de Negócios Mkt	**21**	Unidade de negócio adicional (Organizações adicionais)	Additional Business Unit (+1)	Unidade de negócios	1	R$ 6.015,20	R$ 6.015,20
Certificado SSL	**22**	Certificados SSL (4 por unidade de negócio adicional)	SSL Certificate (4 unidades por BU)	Conjunto de certificados /mês	1	R$ 483,96	R$ 483,96
Suporte do Fabricante	**23**	Monitoramento Avançado de Auditoria e Suporte	Premier Success Plan - Marketing Cloud Engagement	Pacote de Serviços	1	R$ 31.801,61	R$ 31.801,61

	24	Suporte avançado do fabricante	Signature Success - Marketing Cloud Engagement	Adicional de Suporte Avançado do Fabricante	1	R$ 125.223,87	R$ 125.223,87
Plataforma Telefonia Digital	**25**	Plataforma de telefonia digital	CXone Mpower Voice Agent e Services	Plataforma /mês	1	R$ 68.533,59	R$ 68.533,59
IA Generativa para voz	**26**	Inteligência Artificial Generativa para Telefonia	Cognigy AI Voice Enablement (per conversation) 130 mil/mês	Por Conversação /mês	0,15	R$ 206.478,79	R$ 30.971,82
Infraestrutura Telefonia	**27**	Porta Universal	Configured Universal Port (in excess of included Port(s))	Infra/mês	1	R$ 138,52	R$ 138,52
	28	Infraestrutura adicional	Infra Variável de Telefonia (portas, armazenamento, tráfego)	Infra/mês	1	R$ 335,51	R$ 335,51
					Subtotal	**R$ 578.919,24**	

Esclarecimento dos Itens:

1 - **Atendentes Omnichannel em tempo real - síncronos - Service Cloud Enterprise Edition + Digital Engagement Enterprise Edition** - Versão premium do Service Cloud para atendimento ao cliente, com recursos avançados de escalabilidade, produtividade, autoatendimento e automação; inclui base de conhecimento e Live Agent (chat web); com Digital Engagement, sincroniza atendimentos em canais digitais como WhatsApp, SMS, chats e similares.

7 - Marketing Cloud Engagement - Enterprise Edition - Plataforma de campanhas de marketing e comunicação, automatiza campanhas de marketing, viabiliza escalabilidade do Marketing Cloud Engagement com capacidades de agentes de IA; personaliza e automatiza jornadas de e-mail, mobile e web em larga escala.

8 - **Additional Contacts** - A carga da base de contatos do Registro Municipal Integrado faz parte do Setup, por isso a necessidade de incluir os pacotes adicionais de contatos desde o início do Projeto.

9 - **Private Domain** - Contratação de domínio, faixa de IPs dedicada e trilha de auditoria para o serviço de disparos. Necessário configurar upfront.

10 - **Certificado SSL - Gestão de Campanhas** - Certificado de Segurança SSL para o módulo de Gestão de Campanhas (Marketing Cloud)

14 - **Data Services Card 100K** - Créditos de data cloud, necessários para configuração das pipelines de disparo.

16 - **Privacy Center** - Ferramenta para atender LGPD

17 - **Event Monitoring** - Item de segurança, que precisa ser configurado upfront

18 - **Customer Community - Unlimited Edition - Logins** - O quantitativo previsto corresponde a 6% do total estimado para o final do primeiro ano, sendo o mínimo necessário para viabilizar os testes, a validação funcional e a homologação da solução durante a fase de desenvolvimento do portal.

Essa previsão inicial reduzida é justificada pela própria lógica de implantação gradual da solução, na qual o ambiente precisa ser disponibilizado com um volume controlado de acessos para permitir o trabalho das equipes técnicas e de negócio sem onerar, de imediato, a contratação da capacidade plena.

Em outras palavras, trata-se de uma quantidade estrategicamente dimensionada para garantir a execução segura da etapa de implantação, servindo como base para aferição de desempenho, ajustes de configuração e validação dos fluxos antes da ampliação do uso pela totalidade dos usuários previstos.

20 - **MuleSoft - Additional vCore Production -Titanium Edition (No Flex) -** Middleware de integração para ser utilizado com os sistemas externos dos órgãos.

21 - **Additional Business Unit (+1)** - Instância segregada do Marketing Cloud dedicada ao ciclo de desenvolvimento . Funciona como um espaço de trabalho independente que permite

gerenciar dados, usuários e jornadas de comunicação por unidade de negócio. O Marketing Cloud vai ser a ferramenta institucional oficial da Prefeitura para envio de mensageria via WhatsApp, E-mail, SMS e Push.

A contratação de unidades de negócio adicionais visa atender a necessidade de outros órgãos que hoje já possuem disparos de e-mail transacionais e que terão que adequar/transferir os seus fluxos de disparo para a nova ferramenta (que traz consigo toda a camada de segurança de LGPD, coleta de consentimento e rastreabilidade completa) O primeiro órgão que utilizará a instância adicional será a CIVITAS e estamos iniciando esse processo de configuração.

22 - **SSL Certificate (4 unidades por BU)** - Certificados SSL da Plataforma de Serviços - (Service Cloud)

23 - **Premier Success Plan - Marketing Cloud Engagement** - Planos de suporte básico, necessário para contratação do avançado

24 - **Signature Success - Marketing Cloud** - Planos de suporte avançado da Salesforce

25 - **CXone Mpower Voice Agent e Services** - Sistema da NICE de telefonia

26 - **Cognigy Al Voice Enablement (per conversation)** - Créditos de IA para desenvolvimento da ferramenta de telefonia, capacidade de IA Generativa para voz na URA, que está alocada com a menor quantidade de horas possível para setup e configuração.

27 - **Configured Universal Port (in excess of included Port(s))** - Infraestrutura de telefonia

28 - **Infra Variável de Telefonia (portas, armazenamento, tráfego) -** Infraestrutura de telefonia

Valor Total - Março de 2026

Licenciamento	**R$ 578.919,24**
Serviços Especializados	**R$ 264.544,00**
Total	**R$ 843.463,24**

Casa Civil

IplanRio - Simone Torres De Assumpção
Assessora Especial para Parcerias
Matrícula: 620.874-5

ANEXO I - Relatório Detalhado de Horas

Historia (Key)	Historia (Titulo)	Subtarefa (Key)	Subtarefa (Titulo)	Data	Horas
CZRM-45	Criar componente de mapas (ArcGIS)	CZRM-245	Analise da Documentacao do Componente	2026-03-25	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-251	Analise da estrutura de consentimento	2026-03-18	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-253	Analise da estrutura do Data Cloud	2026-03-20	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-254	Analise da Estrutura do Data Cloud	2026-03-23	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-254	Analise da Estrutura do Data Cloud	2026-03-24	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-254	Analise da Estrutura do Data Cloud	2026-03-25	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-267	Analise da Estrutura do Service Cloud	2026-03-06	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-267	Analise da Estrutura do Service Cloud	2026-03-09	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-267	Analise da Estrutura do Service Cloud	2026-03-10	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-267	Analise da Estrutura do Service Cloud	2026-03-11	8

CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-267	Analise da Estrutura do Service Cloud	2026-03-12	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-267	Analise da Estrutura do Service Cloud	2026-03-13	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-266	Analise de Componente	2026-03-02	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-266	Analise de Componente	2026-03-03	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-266	Analise de Componente	2026-03-04	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-266	Analise de Componente	2026-03-05	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-252	Analise do MKT Cloud	2026-03-19	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-243	Analise Tecnica SECONSERVA (30/03)	2026-03-30	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-244	Analise Tecnica SECONSERVA (31/03)	2026-03-31	8
CZRM-116	Elaboracao do plano de treinamento (Mar/26)	CZRM-262	Assistencia na elaboracao do plano de comunicacao	2026-03-03	10
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-238	Atividades diarias (09/03)	2026-03-09	8
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-239	Atividades diarias (10/03)	2026-03-10	8
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-240	Atividades diarias (11/03)	2026-03-11	8
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-241	Atividades diarias (12/03)	2026-03-12	8
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-242	Atividades diarias (13/03)	2026-03-13	8
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-233	Atividades diarias (16/03)	2026-03-16	8
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-234	Atividades diarias (17/03)	2026-03-17	8
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-235	Atividades diarias (18/03)	2026-03-18	8
CZRM-112	Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-236	Atividades diarias (19/03)	2026-03-19	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-182	Atividades diarias 02/03	2026-03-02	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-172	Atividades diarias 03/03	2026-03-02	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-183	Atividades diarias 04/03	2026-03-04	8

CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-184	Atividades diarias 05/03	2026-03-05	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-185	Atividades diarias 06/03	2026-03-06	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-186	Atividades diarias 09/03	2026-03-09	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-187	Atividades diarias 10/03	2026-03-10	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-188	Atividades diarias 11/03	2026-03-11	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-189	Atividades diarias 12/03	2026-03-12	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-190	Atividades diarias 13/03	2026-03-13	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-191	Atividades diarias 16/03	2026-03-16	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-192	Atividades diarias 17/03	2026-03-17	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-193	Atividades diarias 18/03	2026-03-18	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-194	Atividades diarias 19/03	2026-03-19	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-196	Atividades diarias 20/03	2026-03-20	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-198	Atividades diarias 23/03	2026-03-23	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-197	Atividades diarias 24/03	2026-03-24	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-199	Atividades diarias 25/03	2026-03-25	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-199	Atividades diarias 25/03 (2o lancamento)	2026-03-25	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-200	Atividades diarias 26/03	2026-03-26	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-201	Atividades diarias 27/03	2026-03-27	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-202	Atividades diarias 30/03	2026-03-30	8
CZRM-95	Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-203	Atividades diarias 31/03	2026-03-31	8
CZRM-93	Gestor de Projeto - IplanRio (Mar/26)	CZRM-259	Atividades diarias de gestao de projeto	2026-03-02	176
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-215	Avaliacao de estrutura arquitetura de Mulesoft	2026-03-17	4

CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-205	Avaliacao e definicao do MKT Cloud e Agentforce	2026-03-03	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-211	Checkpoint com SUBTD definicao de campos salesforce	2026-03-11	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-207	Checkpoint com SUBTD validacao de campos e regras de negocios	2026-03-05	8
CZRM-118	Construcao da Matriz de Riscos (Mar/26)	CZRM-264	Conducao da construcao da Matriz de Riscos	2026-03-05	10
CZRM-117	Construcao da Matriz RACI (Mar/26)	CZRM-263	Conducao da construcao da Matriz RACI	2026-03-04	10
CZRM-96	Analista Financeiro - IplanRio (Mar/26)	CZRM-257	Confeccao de relatorio de faturamentos e alinhamentos com CVL	2026-03-31	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-206	Configuracao de SSO MKT + Avaliacao portal Salesforce	2026-03-04	8
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-173	Configuracao do Mulesoft para hospedar a API	2026-03-24	6
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-222	Configuracao Inicial do ambiente de DEV no Mulesoft	2026-03-20	4
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-224	Configuracao Inicial do ambiente de PROD no Mulesoft	2026-03-23	4
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-223	Configuracao Inicial do ambiente de UAT no Mulesoft	2026-03-20	4
CZRM-36	Configurar WABA	CZRM-250	Configuracao no MKT Cloud	2026-03-16	8
CZRM-37	Configurar SAP	CZRM-37	Configurar SAP (lancamento direto)	2026-03-17	8
CZRM-45	Criar componente de mapas (ArcGIS)	CZRM-246	Criacao do Componente	2026-03-26	8
CZRM-45	Criar componente de mapas (ArcGIS)	CZRM-247	Criacao do Componente	2026-03-27	8
CZRM-45	Criar componente de mapas (ArcGIS)	CZRM-248	Criacao do Componente	2026-03-30	8
CZRM-45	Criar componente de mapas (ArcGIS)	CZRM-249	Criacao do Componente	2026-03-31	8
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-176	Criacao do flow de request para IPP	2026-03-25	2

CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-177	Criacao do flow de Scheduler para fazer o Batch	2026-03-25	3,5
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-217	Criacao do Objeto customizado de Catalogo de Servico Salesforce	2026-03-18	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-221	Criacao do Objeto Customizado de Divisao Administrativa	2026-03-19	8
CZRM-100	Criar objeto Unidade Organizacional	CZRM-218	Criacao do objeto customizado Organization_Unity__c	2026-03-30	3
CZRM-100	Criar objeto Unidade Organizacional	CZRM-219	Criacao dos campos para o Organization_Unity__c	2026-03-18	3
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-216	Definicao de integracao via Mulesoft	2026-03-17	4
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-214	Definicao estrategica de criacao de campos customizados	2026-03-16	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-204	Definicoes de criacao de Objetos Custom [Salesforce]	2026-03-02	8
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-179	Deploy da api ipp-pgeo-sys-api em Dev	2026-03-26	3
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-230	Desenvolvimento arquitetura da migracao do Mulesoft como Middleware	2026-03-31	8
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-174	Escrita do RAML do ipp-pgeo-sys-api	2026-03-25	2
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-212	Explicacao/Validacao da estrutura inicial do Service Cloud	2026-03-12	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-212	Explicacao/Validacao da estrutura inicial do Service Cloud	2026-03-03	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-212	Explicacao/Validacao da estrutura inicial do Service Cloud	2026-03-04	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-212	Explicacao/Validacao da estrutura inicial do Service Cloud	2026-03-10	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-212	Explicacao/Validacao da estrutura inicial do Service Cloud	2026-03-12	8

CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-212	Explicacao/Validacao da estrutura inicial do Service Cloud	2026-03-23	8
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-226	Montar analise dos 1300 campos para o IPP	2026-03-27	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-210	Overview Salesforce Data Foundation	2026-03-10	8
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-213	Refinamento de campos customizados	2026-03-20	4
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-209	Revisao das configuracoes iniciais para Mulesoft	2026-03-09	8
CZRM-115	Revisao do plano de comunicacao (Mar/26)	CZRM-261	Revisao/Ajuda na elaboracao do Plano de comunicacao	2026-03-02	10
CZRM-100	Criar objeto Unidade Organizacional	CZRM-220	Validacao de regra de campos relacionados	2026-03-18	2
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-208	Validacao de regras de negocios para os Campos custom	2026-03-06	8
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-180	Validacao do Scheduler IPP	2026-03-27	2
CZRM-113	Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	CZRM-225	Validacao dos campos com erros CSV do IPP da integracao com o Mulesoft	2026-03-27	8
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-175	Validacao dos campos do IPP para conectar com Mulesoft	2026-03-25	0,5
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-178	Validacao e Teste do Batch para o Salesforce	2026-03-26	3
CZRM-66	Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	CZRM-178	Validacao e Teste do Batch para o Salesforce (2o lancamento)	2026-03-26	2

Visão por História

Historia (Titulo)	Soma Horas	Classificação	Descrição

Analise de processos e solucoes - TO Brasil (Mar/26)	320	Arquiteto + Core + Mkt Cloud + Mulesoft	Variável de acordo com a quantidade de análises e temas de discovery, que percorreram diferentes disciplinas e perfis
Gestor de Projeto - TO Brasil (Mar/26)	184	Gestão	Horas de gestão dedicadas ao projeto: 8 horas diárias x 22 dias úteis + 8 horas extras
Gestor de Projeto - IplanRio (Mar/26)	176	Gestão	Horas de gestão dedicadas ao projeto: 8 horas diárias x 22 dias úteis
Arquiteto de solucao - TO Brasil (Mar/26)	72	Arquiteto	Horas dedicadas ao desenho da solução arquitetural, incluindo definição e modelagem dos objetos de dados, mapeamento dos fluxos de processo e avaliações de escalabilidade da plataforma.
Criar componente de mapas (ArcGIS)	40	Core	Desenvolvimento de componente de mapa para fluxo de abertura de chamados
Integracao com IPP para extracao diaria de logradouros (Via Mulesoft)	32	Mulesoft	Integração para viabilizar roteirização de chamados para diferentes órgãos e filas operacionais, obedecendo os diferentes recortes administrativos e áreas de atuação de diferentes órgãos.
Revisao do plano de comunicacao (Mar/26)	10	GMO	Horas dedicadas à revisão e atualização do plano de comunicação do projeto, definindo canais, públicos-alvo, frequência e responsáveis pelas comunicações ao longo do projeto.
Elaboracao do plano de treinamento (Mar/26)	10	GMO	Horas dedicadas à elaboração do plano de treinamento, incluindo definição de trilhas de capacitação, públicos, cronograma e materiais necessários para a adoção do sistema.
Construcao da Matriz RACI (Mar/26)	10	GMO	Horas dedicadas à construção da Matriz RACI do projeto, com mapeamento de responsabilidades, aprovações,

			consultas e comunicações entre os envolvidos nas principais entregas.
Construcao da Matriz de Riscos (Mar/26)	10	GMO	Horas dedicadas à construção da Matriz de Riscos, com identificação, classificação por probabilidade e impacto, e definição de planos de mitigação para os principais riscos do projeto.
Criar objeto Unidade Organizacional	8	Core	Horas dedicadas à criação e configuração do objeto customizado Unidade Organizacional no Salesforce, incluindo definição de campos, relacionamentos e regras de validação.
Configurar WABA	8	Mkt Cloud	Horas dedicadas à configuração do WhatsApp Business Account (WABA), incluindo provisionamento do número, integração com a plataforma e validação do canal de comunicação.
Configurar SAP	8	Mkt Cloud	Horas dedicadas à configuração da integração com o SAP, incluindo mapeamento de dados, definição de endpoints e validação do fluxo de informações entre os sistemas.
Analista Financeiro - IplanRio (Mar/26)	8	Gestão	Horas dedicadas às atividades de validação e elaboração de relatórios financeiros referentes ao mês de Março/2026.
Total geral	**896**		
